


# RIFACIMENTO DEL PONTE II GIUGNO



Senigallia 07 Ottobre 2020  
Ing. Nafez Saqer (Direzione Lavori)



# MODIFICA DELLA VIABILITÀ

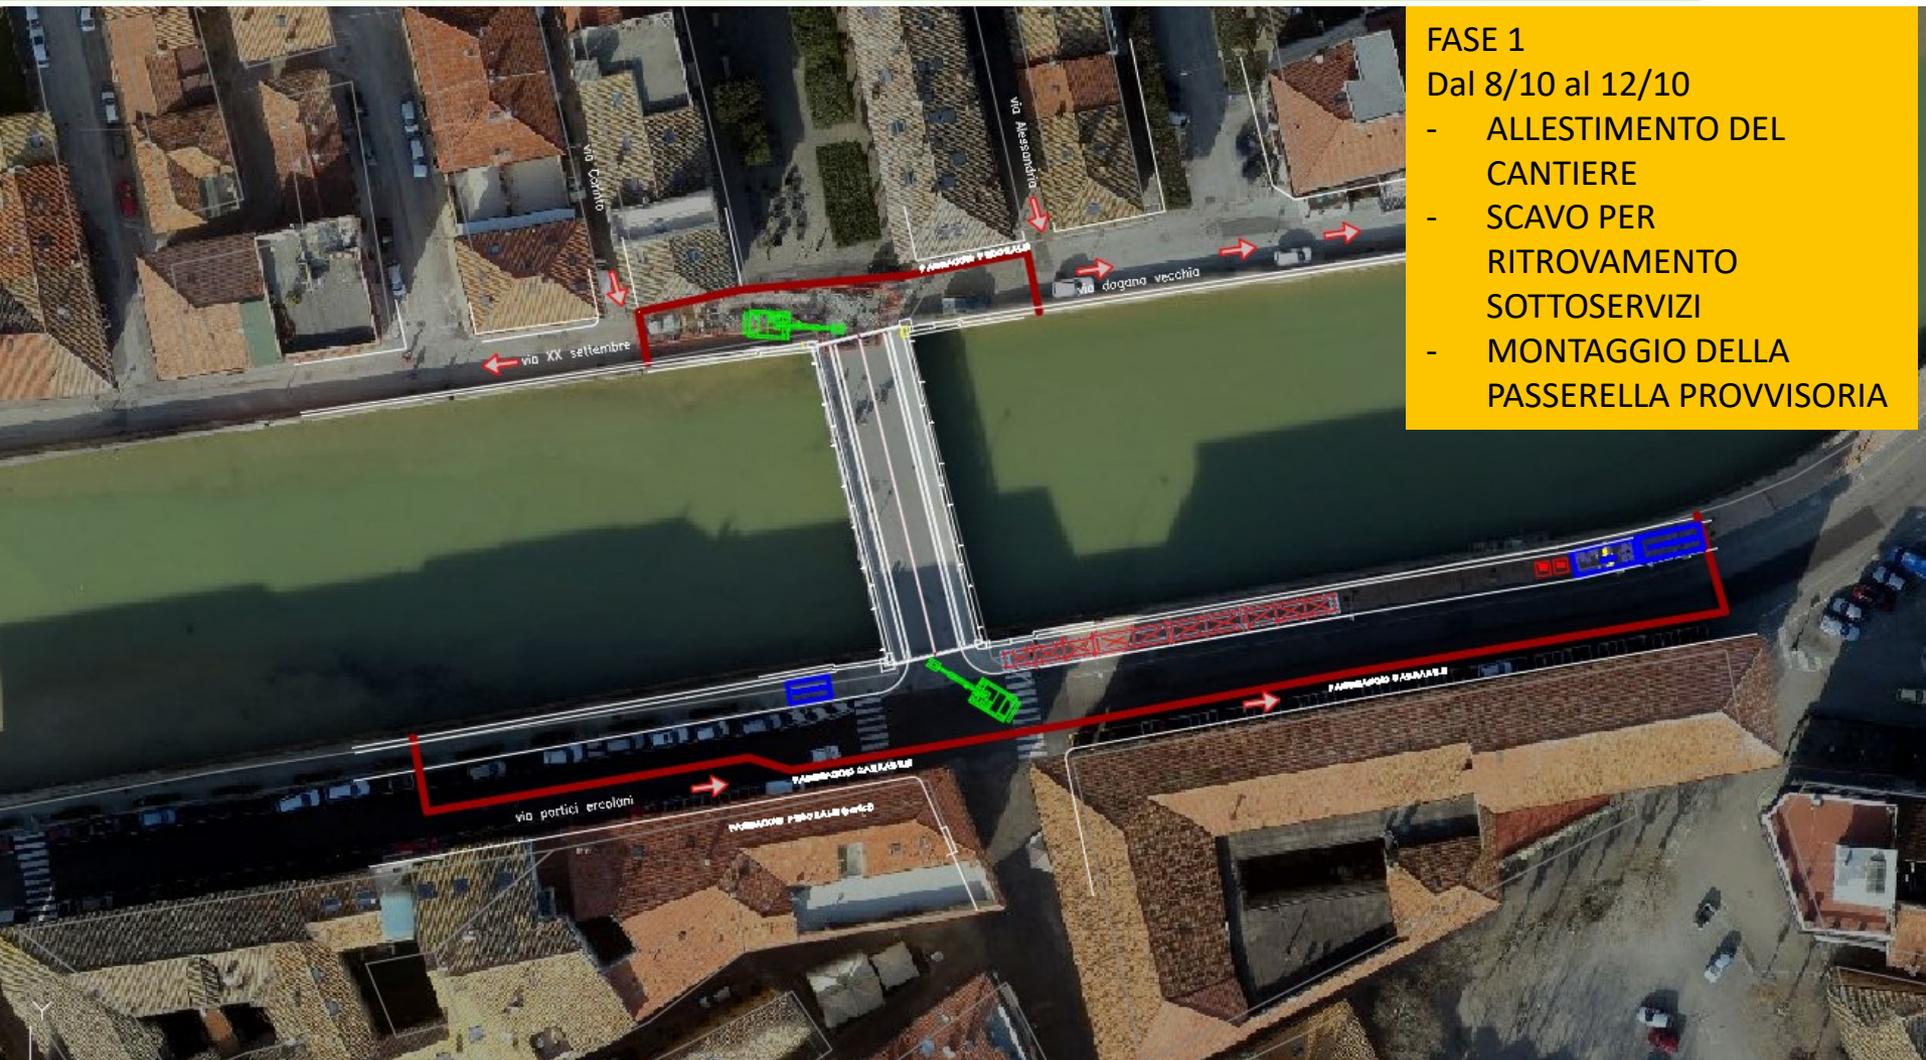

## FASE 1

Dal 8/10 al 12/10


- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
- SCAVO PER RITROVAMENTO SOTTOSERVIZI
- MONTAGGIO DELLA PASSERELLA PROVVISORIA

# MODIFICA DELLA VIABILITÀ

FASE 2

Dal 13/10 al 15/10

- VARO DELLA PASSERELLA  
PROVVISORIA

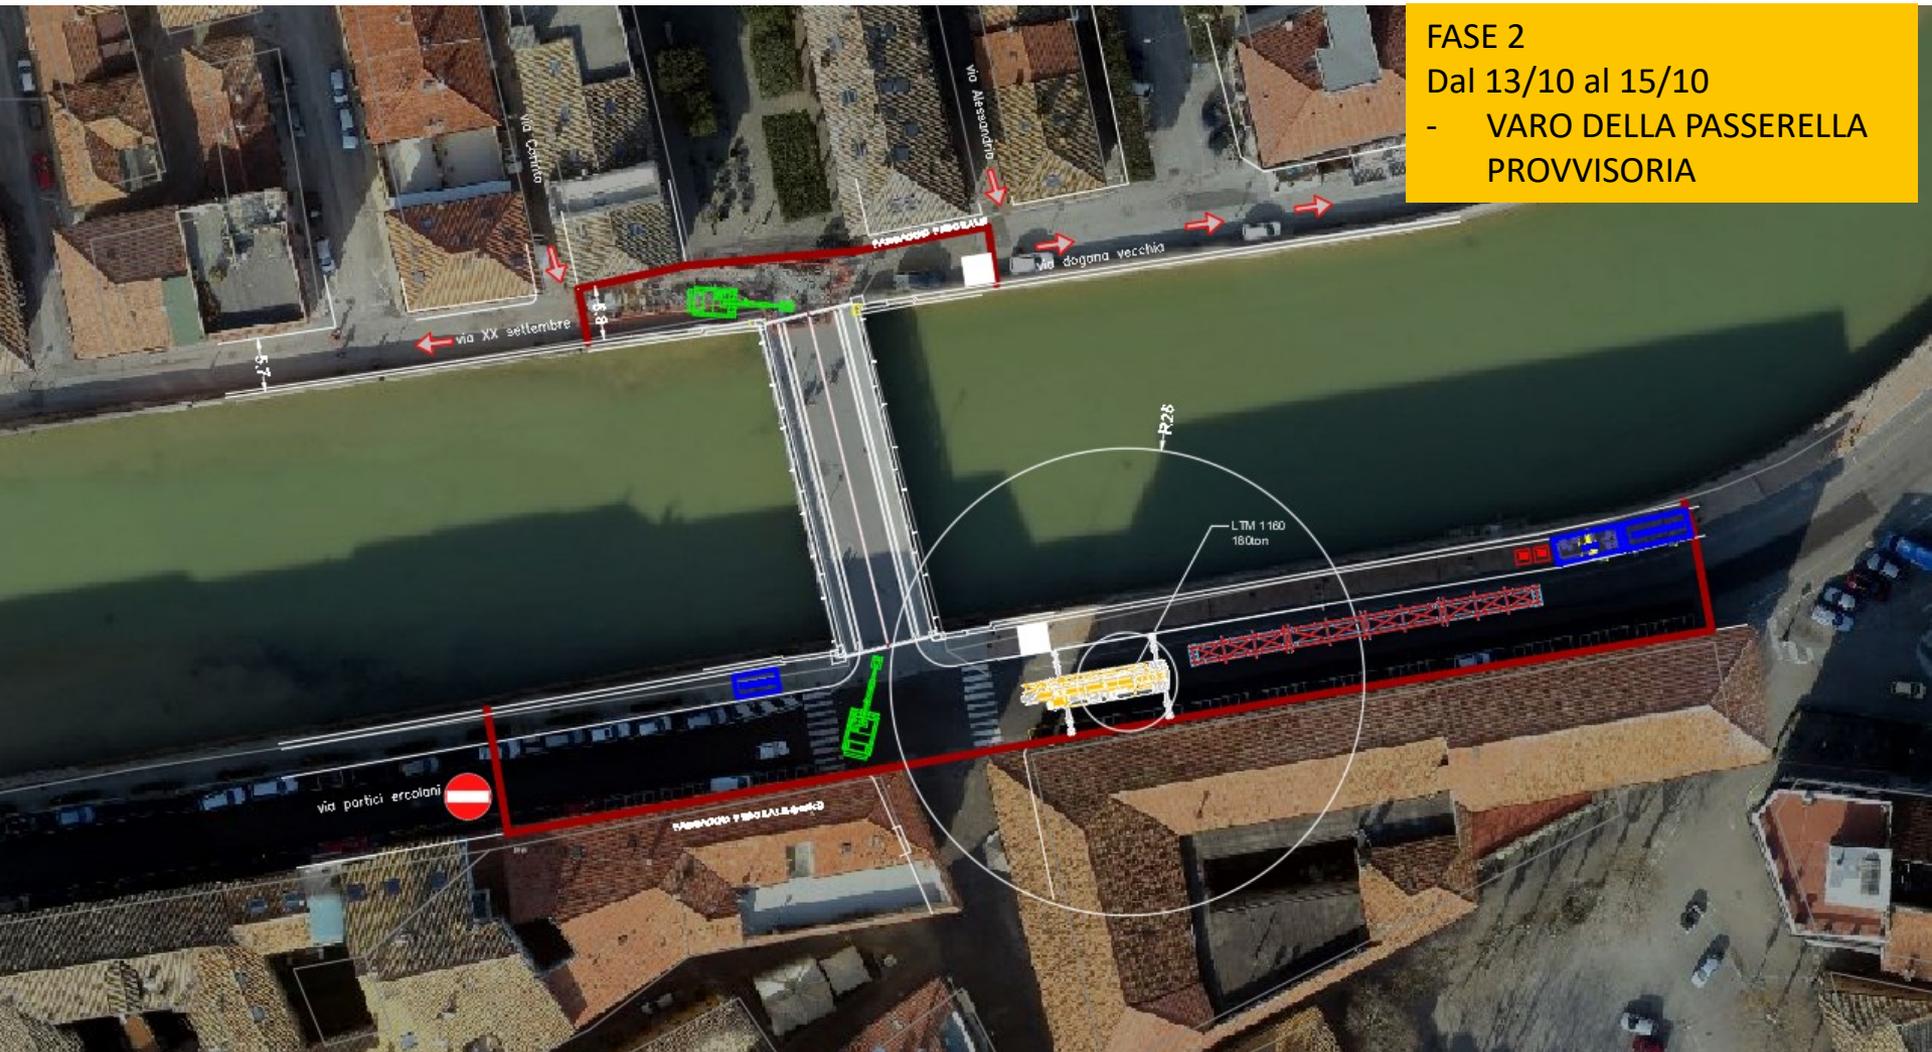

# MODIFICA DELLA VIABILITÀ

FASE 3

Dal 19/10 al 21/10

- DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE



# MODIFICA DELLA VIABILITÀ

FASE 4

Dal 19/10 al 1/11

- REALIZZAZIONE DEI PALI



# MODIFICA DELLA VIABILITÀ



## FASE 5

Dal 02/11 al 20/11

- DEMOLIZIONE DELLE SPALLE ESISTENTI
- REALIZZAZIONE DELLE ZATTERE DI APPOGGIO

Dal 23/11 al 24/11

- ASSEMBLAGGIO DEL NUOVO PONTE

# MODIFICA DELLA VIABILITÀ


FASE 6

Dal 25/11 al 27/11

- VARO DEL PONTE



# MODIFICA DELLA VIABILITÀ

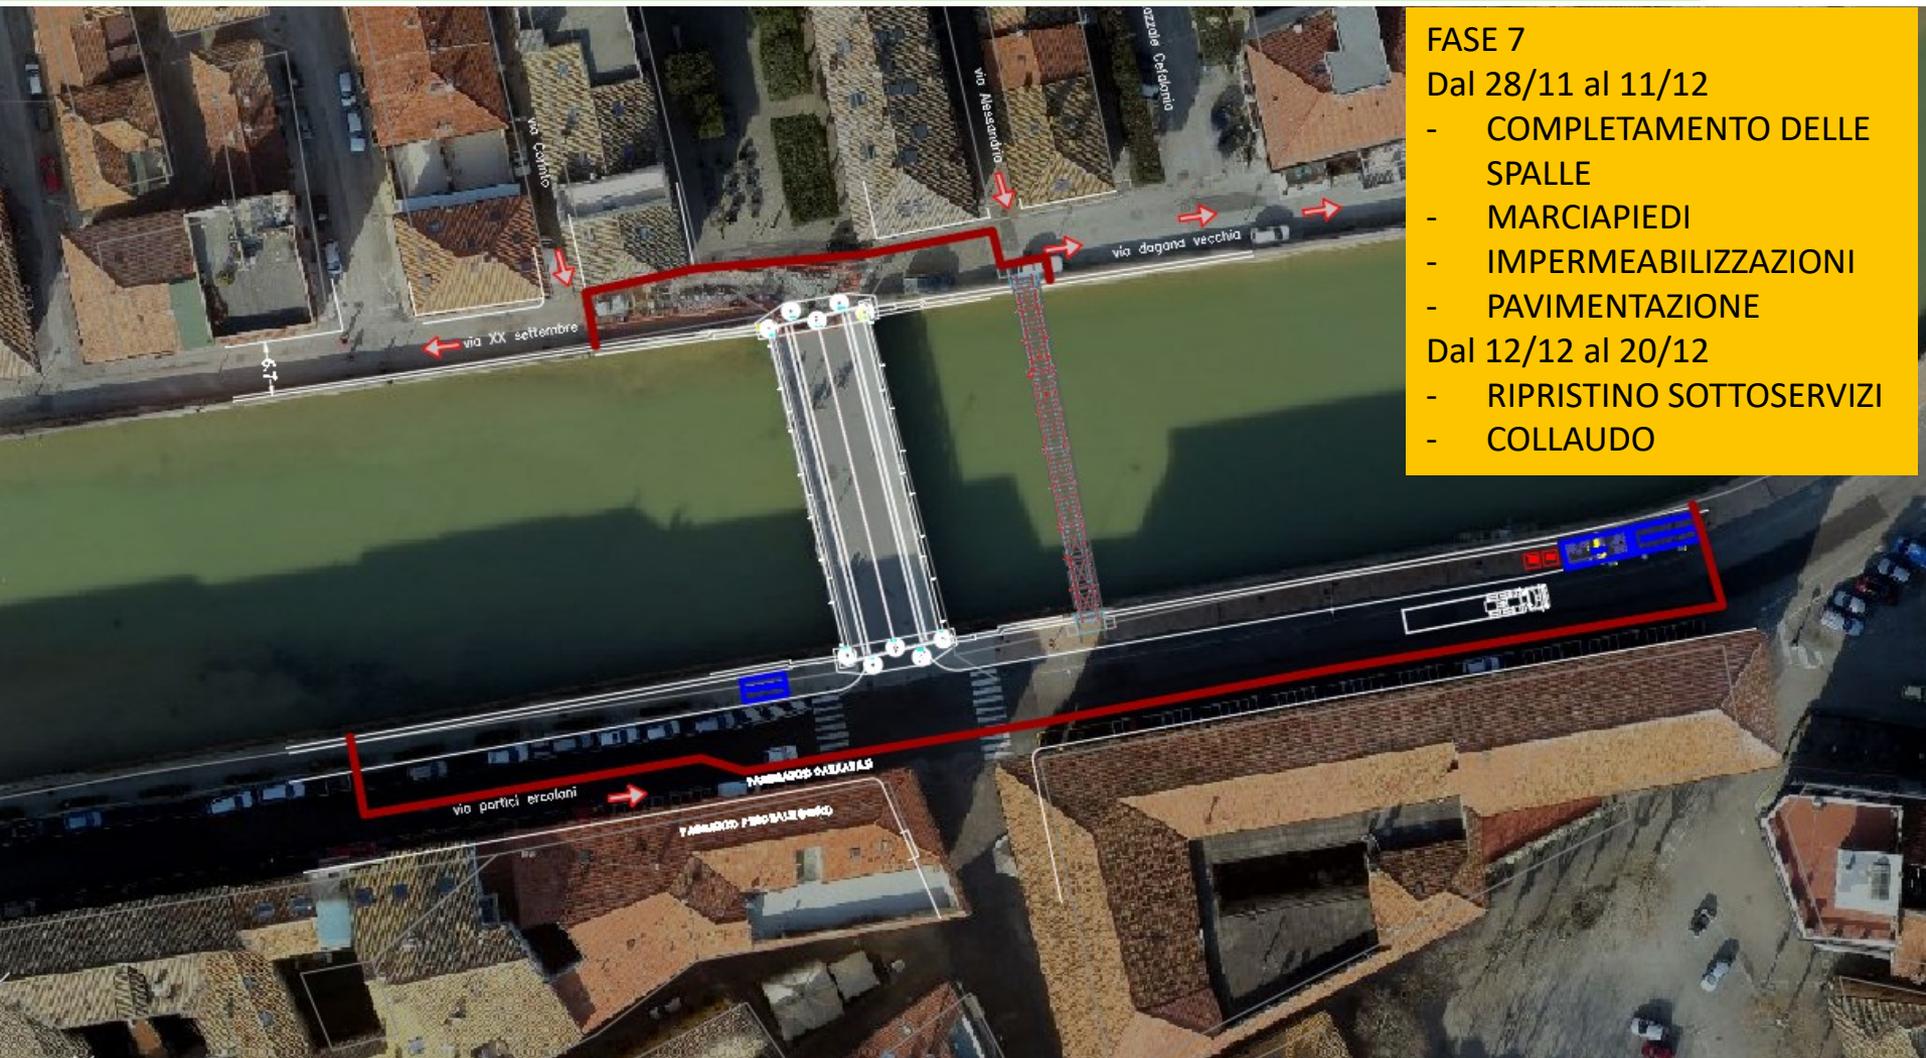

## FASE 7

Dal 28/11 al 11/12

- COMPLETAMENTO DELLE SPALLE
- MARCIAPIEDI
- IMPERMEABILIZZAZIONI
- PAVIMENTAZIONE

Dal 12/12 al 20/12

- RIPRISTINO SOTTOSERVIZI
- COLLAUDO

# MODIFICA DELLA VIABILITÀ FASI 1-3-4-5

